

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL

FACULTAD REGIONAL CÓRDOBA

Ingeniería y Calidad de Software

SCRUM - Ejercicio de aplicación “Parque de Diversiones”

Docentes:

- Titular: Ing. Judith Meles
- Jefa de Trabajos Prácticos: Ing. Valeria Abdala
- Ayudante Alumno: Salvador Barbera

Legajo	Integrante	Cuenta de Git
400831	Franco Agustín Peschiutta	francopeschiutta5@gmail.com
401881	Franco Agustín Pinelli	francoagustinpinelli@gmail.com
402212	Ignacio Daniel Díaz Ahumada	nachytodiaz@gmail.com
403655	Axel Rene Villegas	axelvillegas240@gmail.com
402650	Lucas David Alvarez	lucasalvarez1374@gmail.com
403626	Laila Aylin Leon	lailaleon.universidad@gmail.com
75313	Roch Gaston	gaston.roch1998@gmail.com
68396	Romero Justo Milton Jesus	68396@sistemas.frc.utn.edu.ar
407655	Haziel Rosciszewski	cuentafacuhaz@gmail.com
75198	Pedro Novello	pedrosnovello@hotmail.com
95255	Emiliano Diaz	mumidi2003@gmail.com
403741	Giuliana Agustina Borghetti	403741@sistemas.frc.utn.edu.ar
93310	Thiago Chiesa	thiagochiesa4444@gmail.com
400738	Tomas Allende	TomiMau66@gmail.com

Consideraciones:

- Duración de sprint:
    - Planning: 1er Sprint 5 minutos. 2do y 3ro 2 minutos.
    - Execution: 3 semanas. Adaptados a 3.33 minutos cada semana → 10 minutos.
    - Review: 5 a 6 minutos.

Sprint Planning - Sprint 1

En primer lugar realizamos la siguiente estimación de las US:

Rueda de la fortuna 5 Sp
Pista de autos chocadores 3 Sp
Casa del terror 5 Sp
Montaña rusa 5 Sp
Hamacas en miniatura 5 Sp
Calesita 8 Sp

Se dividirá el equipo en grupos de 4 personas, cada grupo se encargará de una atracción.

Planteamos para este sprint realizar las siguientes atracciones atracciones:

Casa del terror, rueda de la fortuna y montaña rusa. 15 Sp

Sprint Review: Aprobó solamente la rueda de la fortuna. Velocidad 5 Sp

Sprint Planning - Sprint 2

Planteamos para este sprint entregar las dos atracciones pendientes del sprint anterior sumando la pista de autos chocadores → 13 Sp.


Sprint Review: No se aprobó ninguna atracción. Velocidad: 0 Sp


Sprint Planning - Sprint 3


Nos comprometemos a terminar todas las atracciones restantes 21 Sp

Sprint Review: Se aprobaron todas las atracciones. Velocidad: 21 Sp


GRÁFICOS

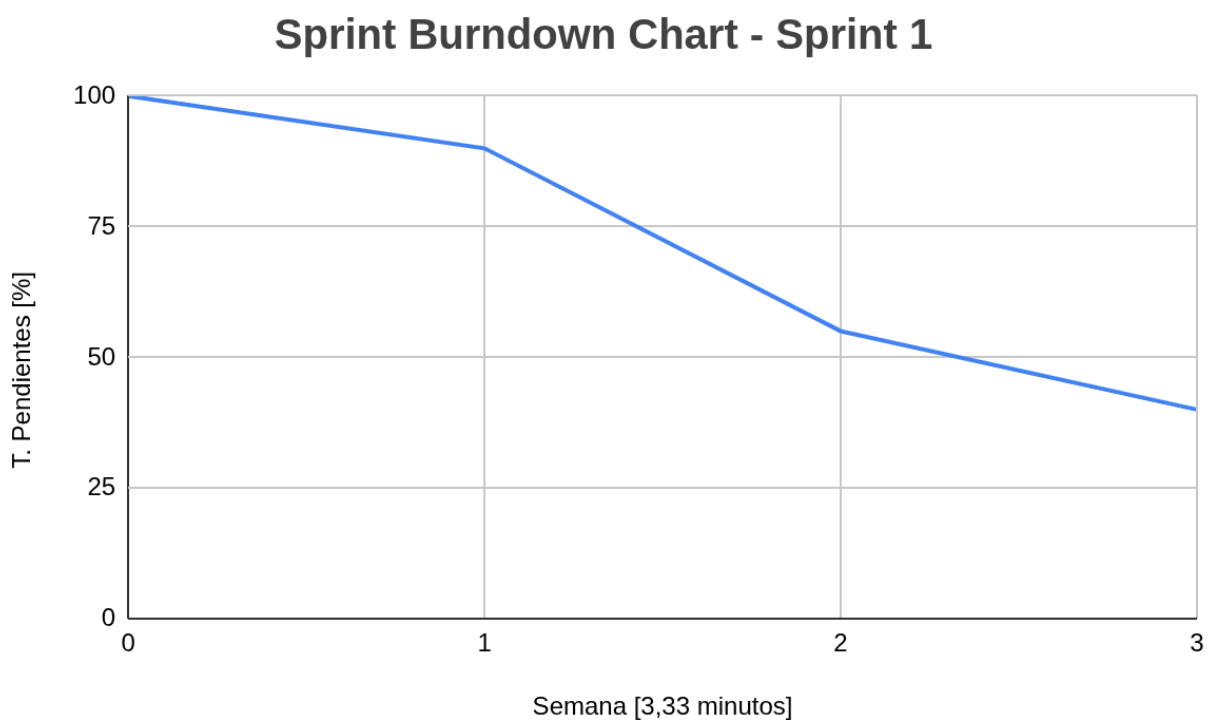
Sprint Burndown Chart - Sprint 1
100
75
50
25
0
T. Pendientes [%]
0
1
2
3
Semana [3,33 minutos]

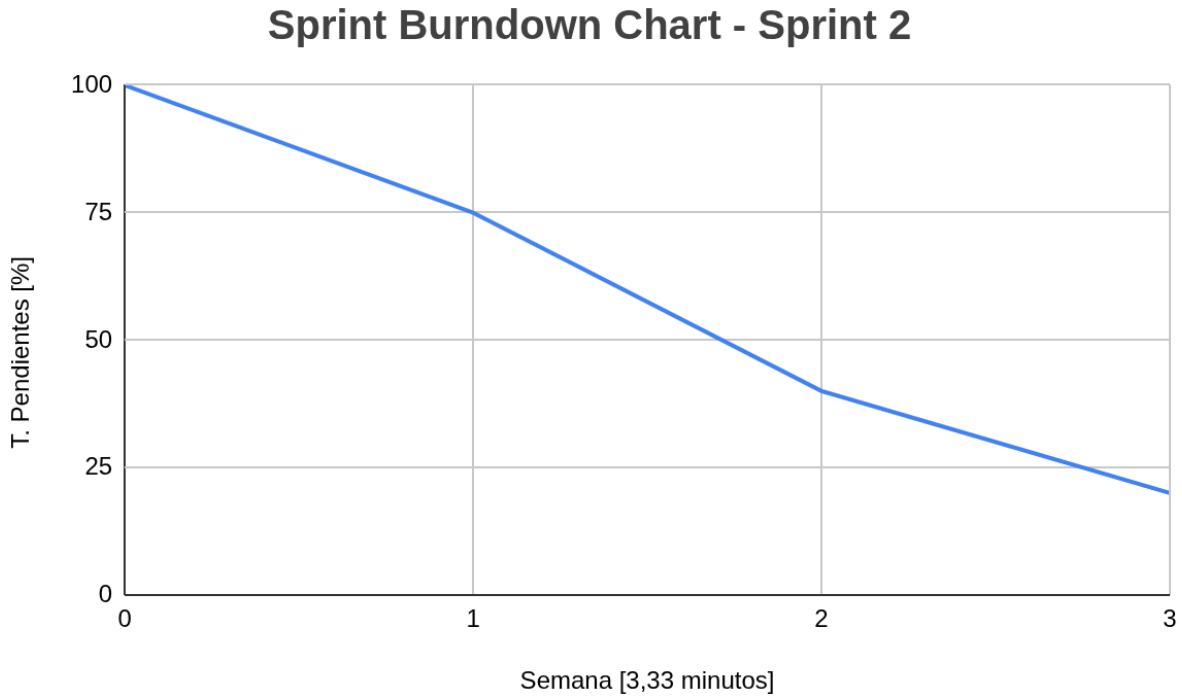
Sprint Burndown Chart - Sprint 2
100
75
50
25
0
T. Pendientes [%]
0
1
2
3
Semana [3,33 minutos]

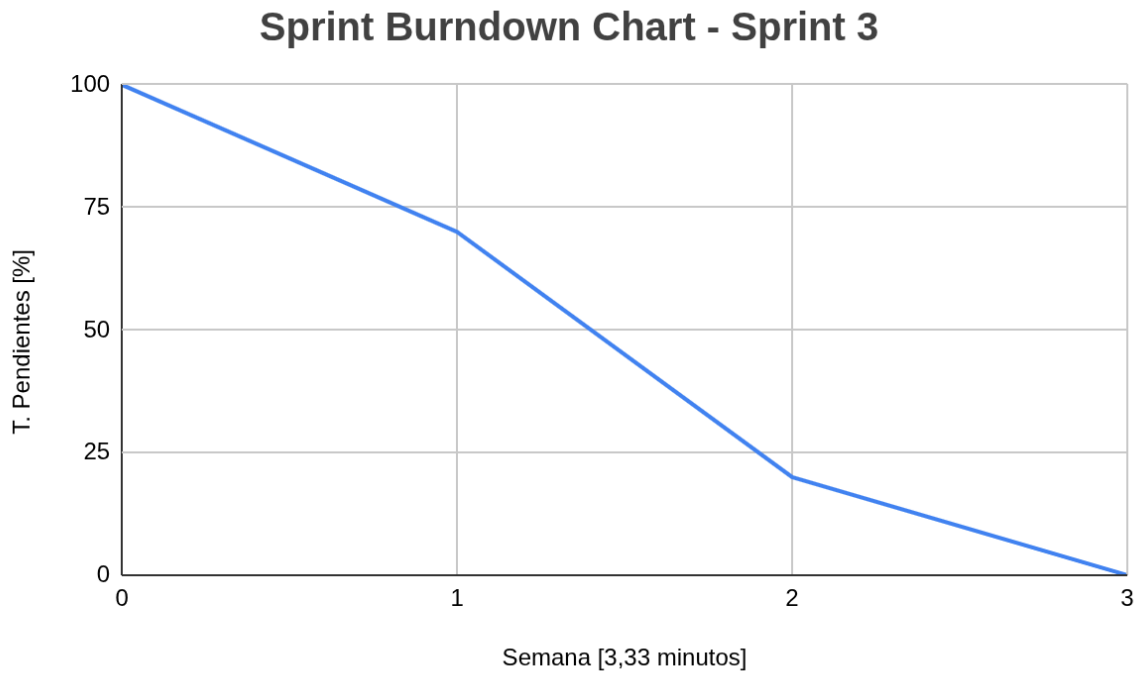


Los gráficos de anteriores que no llegan a terminar el 100 % se deben a qué a qué no se llegó a completar la construcción de las atracciones comprometidas en el planeamiento de ese sprint.

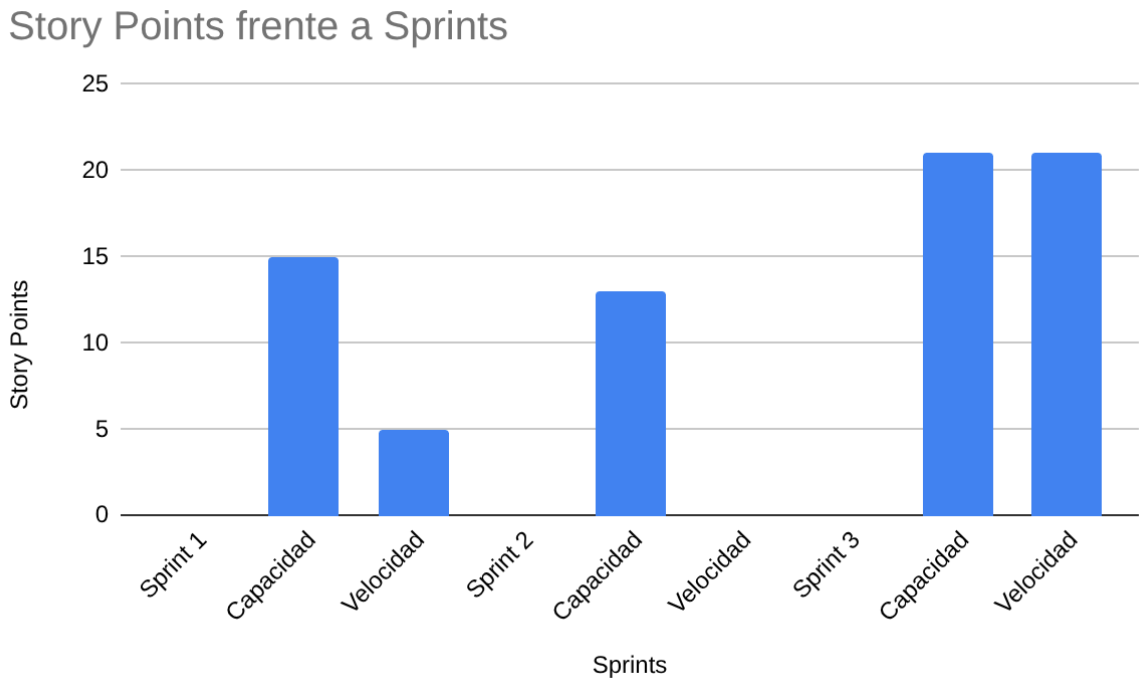

Fotos:






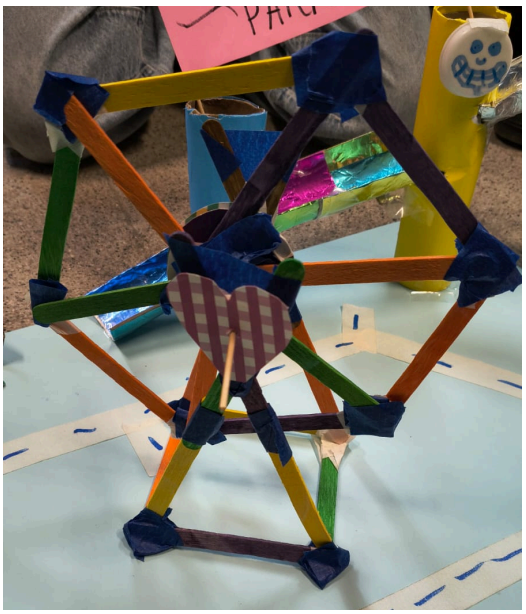





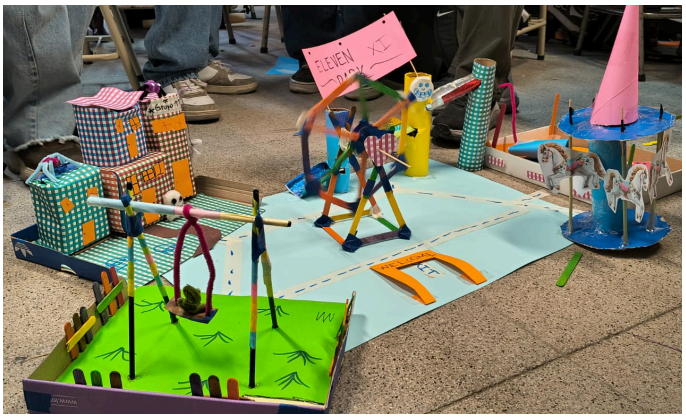

NOTA FINAL: 9
